



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 12:00 horas del día 02 DE AGOSTO DEL 2024 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EN BARRIO LA CIENEGA, EN SAN PEDRO EL VIEJO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.** Por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de obra publicas **ING. RICARDO VIEYRA BONILLA**, el coordinador de supervisión **ING. CIPRIANO MARCELO BALDERAS MENDOZA**. Y el supervisor de obra **ARQ. URIEL ANTONIO RENDÓN RIVERA**, y por parte de la empresa **C. JUSTINO CHAVEZ RINCON** En su carácter de representante legal **C. JUSTINO CHAVEZ RINCON**, para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega- Recepción Física** de los trabajos:

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EN BARRIO LA CIENEGA, EN SAN PEDRO EL VIEJO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.
Localidad	SAN PEDRO EL VIEJO
No. De contrato	MPA.OM.FAISMUN 2024.ADM.2024.084
Programa	FAISMUN 2024
No. De Obra	084
Monto contratado	\$249,950.00
Oficio De Aprobación. No.	465/2024
Fecha Oficio De Aprobación	13 DE FEBRERO
Beneficiarios	533 HABITANTES

### PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 01 DE JULIO DE 2024 y termino 14 DE AGOSTO DE 2024

### Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$249,950.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con el establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

OPERADO RAMO 33  
FAISMUN 2024

FYB



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1 (UNO) FINIQUITO	02/08/2024	Del	01/07/2024	Al	01/08/2024	\$249,950.00	\$249,950.00

R43

~~UARE~~

OPERADO RAMO 33  
FAISMUN 2024

Justino Chavez.



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

**Estado Físico:** Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 1 (UNO) FINIQUITO.

**Pagaré de garantía:**

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad;

CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EN BARRIO LA CIENEGA, EN SAN PEDRO EL VIEJO, PINAL DE AMOLES, QUERETARO.											
I	PRELIMINARES					\$ 9,417.74			\$ 9,768.16		
PRE003	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA CON AREA VISUAL (NORMATIVA MUNICIPAL) DE 90X120 CM CON PATAS DE 120 CM DE ALTURA Y BASTIDOR A BASE DE TUBULAR RECTANGULAR 1 1/2" Y TABLERO DE LAMINA GAL22. ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO. INCLUYE: CONCRETO PARA LA FIJACIÓN DE LAS PATAS (F C=200KG/CM2), RÓTULO EN VINIL AUTO ADHERIBLE EN DOS CARAS, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, LOS ACARREOS NECESARIOS, Y SU COLOCACIÓN DEFINITIVA, SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR MPA.	pa	1.00	\$6,606.55	\$6,606.55	1.00		1.00	100.00%	\$ 6,606.55	
PRE042	LMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN CAMINOS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO. INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, LOCALIZACIÓN DE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACAS, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA MALEZA FUERA DE AREA DE TRABAJO, AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	m2	206.25	\$13.63	\$2,811.19	231.96		231.96	112.47%	\$ 3,161.81	
II	TERRECKERIAS					\$ 40,648.71			\$ 28,856.07		
PRE105	EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CELO ABIERTO EN TERRENO "B", A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE: TRAZO DE FONDO Y TALUD, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIAS, LA CARGA Y EL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DENTRO Y HACIA FUERA DE OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AL DESTINO QUE ESTE AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. MEDIDO COMPACTO P.U.O.T.	m3	10.59	\$148.32	\$1,570.71	23.21		23.21	219.17%	\$ 3,442.51	
PRE140	COMPACTACION DE FONDO DE EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS A 90% DE SU P.V.C.M. PARA UNA PENETRACION DE 20 CM. INCL. HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y MANIOBRAS LOCALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	m2	206.25	\$23.14	\$4,772.63	231.96		231.96	112.47%	\$ 5,367.55	
PRE113	RELLENO CON MATERIAL INERTE MEJORAMIENTO CALIDAD BASE EN AREA DE ARROYO DE CALLE (SALIDAS DE EMERGENCIA), COMPACTACION AL 100% DE SU P.V.S.M. CON MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE ESPESOR. INCL. : MATERIALES, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. MEDIR COMPACTO P.U.O.T.	m3	39.72	\$863.68	\$34,305.37	23.21		23.21	58.43%	\$ 20,046.01	
III	RAMPA					\$ 165,407.69			\$ 178,230.19		
PAV015	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CMS DE ESPESOR, CONCRETO FC= 250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA 6-610-10. PARA ANCHOS 3.0 M x 8.0 m. ACABADO RALLADO A TEXTURIZADOR, JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES DE CONSTRUCCION, CON REFUERZO DE BARRAS CORRUGADAS DE AMARRE DE 1/2" DE 71 CM DE LONGITUD A CADA 75 CM. SOLO EN CASO DE NO HABER ACERO REFUERZO CORRIDO, EN CASO CONTRARIO VER ESPECIFICACION. LOCALIZACIONES SEGUN PROYECTO; JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION 50% DE ACERO DE RIFUERZO CORRIDO, CONSIDERAR BAKER-ROD Y SELLADOR AUTONIVELANTE PARA SELLAR EL CORTE. INCLUYE: SILLETAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, COLADO, CURADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	m2	206.25	\$746.25	\$153,707.81	231.96		231.96	112.47%	\$ 172,868.19	
ALB162	DENTELLON DE CONCRETO ARMADO, SECCION 15X20 CMS. CONCRETO FC= 200KG/CM2 HECHO EN OBRA, CON TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 19 MM, ARMADO CON UNA TIRA DE MALLA ELECTROSLDADA CAL. 6, DE 25 CM DE CANTO MAS DOBLES INCLUYE: CORTE CON DISCO PARA JUNTAS FRIAS @ 3.0 MTS, MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS; ELABORACIÓN, CARGA, ACARREO, VACIADO, VIBRADO, NIVELADO Y CURADO DEL CONCRETO, HABILITADO Y CURADO DE CMBRA, CMBRADO Y DESCOMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	m	43.64	\$268.10	\$11,699.88	20.00		20.00	45.83%	\$ 5,362.00	
SE CONDONA											
1,280.28											
Subtotal					\$215,474.14	Subtotal					\$215,474.14
IVA					\$ 34,475.86	IVA					\$ 34,475.86
Total					\$ 249,950.00	Total					\$ 249,950.00

*[Handwritten signature]*

*CARR*

*R/V'S*

OPERADO RAMO 33  
FAISMUN 2022 33  
24

*Justino Chavez*





ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

ENTREGA EMPRESA

*Justino Chavez*

**C. JUSTINO CHAVEZ RINCON**  
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN  
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO

  
**ING. CIPRIANO MARCELO BALDERAS MENDOZA**

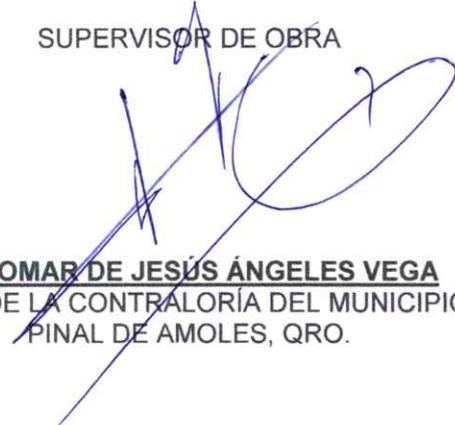
COORDINADOR DE SUPERVISION DE OBRA

  
**ARQ. URIEL ANTONIO RENDÓN RIVERA**

SUPERVISOR DE OBRA

  
**ING. RICARDO VIEYRA BONILLA**

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE  
PINAL DE AMOLES, QRO.

  
**LIC. OMAR DE JESÚS ÁNGELES VEGA**  
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE  
PINAL DE AMOLES, QRO.
