

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 10:00 horas del día 11 de Agosto de 2024, se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEA DE CONDUCCIÓN 1RA ETAPA, PARA BENEFICIAR LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.** por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de obras públicas **Ing. Ricardo Vieyra Bonilla**, el coordinador de supervisor **Ing. Cipriano Marcelo Balderas Mendoza** y el supervisor de obra **ing. Eduardo Resendiz Ramirez** y por parte de la empresa persona física el **C. Enrique Resendiz Ocampo** en su carácter de residente de obra para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega- Recepción Física** de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEA DE CONDUCCIÓN 1RA ETAPA, PARA BENEFICIAR LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO
Localidad	CARRIZALITO
No. De contrato	MPA.DOP.FISE 2024.AD.2024.2024-00557
Programa	FISE 2024
No. De Obra	00557
Monto contratado	\$ 1,199,903.70
Oficio De Aprobación. No.	2024GEQ01074
Fecha Oficio De Aprobación	22 DE MAYO DE 2024
Beneficiarios	79 HABITANTES

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 10 DE JUNIO DE 2024 y termino de obra el 11 DE AGOSTO DE 2024

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$ **1,199,903.70** UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 70 /100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con el establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha		Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:
1(Una)	11/07/2024	Del	10/06/2024	Al	10/07/2024	\$768,789.63	\$768,789.63
2 DOS FINQUITO	21/08/2024	DEL	11/07/2024	AL	11/08/2024	\$402,592.81	\$1,171,382.44

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 2 (DOS) FINQUITO.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OPERADO RAMO 33
FISE 2024

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga **fianza**, que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/1072D/2024**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **21 DE AGOSTO DE 2024**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumpliendose la metas originales de la obra, por lo que resulta procendente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una ves leida por las presentes firmas de conformidad .

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Clave	Cantidad	Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)

OPERADO RAMO 33
FISE 2024

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	TOTAL CONTRATADO	ESTIMACION No. 1	ESTIMACION No. 2	VOLUMEN ACOMULADO	AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
-------	----------	--------	------------	----	------------------	------------------	------------------	-------------------	----------	------------------

AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEA DE CONDUCCIÓN 1RA ETAPA, PARA BENEFICIAR LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.										
1	PRELIMINARES LINEA DE ABAJO				\$ 16,054.05					\$ 16,054.05
PREO 02	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA CON ÁREA VISUAL (NORMATIVA ESTATAL) DE 120X240 CM CON PATAS DE 150 CM DE ALTURA Y BASTIDOR A BASE DE TUBULAR DE LÁMINA DE 3" Y TABLERO DE LÁMINA CAL.22, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICO. INCLUYE: CONCRETO PARA LA FIJACIÓN DE LAS PATAS (F'C=200KG/CM2), RÓTULO EN VINIL AUTOADHERIBLE EN DOS CARAS, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, LOS ACARREOS NECESARIOS, Y SU COLOCACIÓN DEFINITIVA. SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR GEQ. P.U.O.T.	pza	1.00	\$9,724.95	\$9,724.95	-	1.00	1.00	100.00%	\$ 9,724.95
PREO 43	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRAULICA Y/O SANITARIA CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, LOCALIZACIÓN DE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACAS, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA MALEZA FUERA DE AREA DE TRABAJO, AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	m2	730.00	\$8.67	\$6,329.10	-	730.00	730.00	100.00%	\$ 6,329.10
2	VALVULAS Y CONEXIONES LINEA DE ABAJO				\$53,312.57					\$78,422.43

OPERADO RAMO 33
FISE 2024

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

PRE1 07	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN ZANJAS EN TERRENO "B", A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD; LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIAS; LA CARGA Y EL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DENTRO Y HACIA FUERA DE OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AL DESTINO QUE ESTÉ AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. MEDIDO COMPACTO. P.U.O.T.	m3	1.43	\$131.42	\$187.93	-	-	0.00%	\$
PRE1 08	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA Y MARTILLO HIDRÁULICO EN ZANJA EN TERRENO TIPO "C", A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD; EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIAS; LA CARGA Y EL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DENTRO Y HACIA FUERA DE OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AL DESTINO QUE ESTÉ AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. MEDIDO COMPACTO. P.U.O.T.	m3	0.61	\$425.13	\$259.33	-	-	0.00%	\$
IHIDA 002	CAJA DE VALVULAS TIPO II DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, APLANADO INTERIOR, LOSA DE 14 CM, CONTRAMARCO DE CANAL 4", DE 1.10 M, MARCO Y TAPA DE Fo. Fo. TRAFICO PESADO, PARA UNA VALVULA EN TEE, SEGUN PLANO DE PROYECTO. INCL: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	2.00	\$9,845.02	\$19,690.04	-	1.00	50.00%	\$ 9,845.02
IHIDA 34	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2" (51 MM.) DE DIÁMETRO NOMINAL; VÁSTAGO FIJO DE ACERO INOXIDABLE; EXTREMOS BRIDADOS (ANSI 150); CUERPO Y TAPA DE HIERRO DÚCTIL; DISCO DE HIERRO DÚCTIL ENCAPSULADO CON HULE (EPDM); TORNILLERÍA EN ACERO EMBUTIDO EN PLÁSTICO;	pza	2.00	\$5,351.07	\$10,702.14	-	2.00	100.00%	\$ 10,702.14

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

	RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR CON EPÓXICO COLOR AZUL; PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 250 PSI; NORMA AWWA C515, PUESTA EN OBRA (CUMPLIR ESPECIFICACIÓN SUAPVA3000-CEA), INCLUYE: EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLERÍA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMOETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.									
IHID4 51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE DE 1/2" DE DIÁMETRO, CLASE 125, CUERPO Y TAPA DE HIERRO GRIS ASTM 126 GRADO B, RECUBIERTO EPOXICO AZUL POR FUSIÓN, NORMA AWWA C550, ROSCA NPT PN16, FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE ASTM A240, ASIENTO BUNA - N (ACRILONITRIL) ASTM D2000, CUBIERTA COLD ROLLED, TORNILLOS MIL Y ALLEN ACERO SAE GRADO 2 Y ACERO ALEADO RC38 GRADO 9 TROPICALIZADOS, TAPON DE COMBINACIÓN Y LLENADO DE BRONCE, ROSCABLE PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO 200 PSI, REFERENCIA: A1 SIMEX, INCLUYE: REDUCCIÓN BUSHING GAL. X" A 1/2", 2 NIPLES GAL. 1/2" C-40, VÁLVULA DE ESFERA WOG 400PSI, PERMATEX, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P. U. O. T.	pza	1.00	\$3,789.65	\$3,789.65	-		-	0.00%	\$
IHID4 18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA A/C ROSC. 2" CLASE 150, PUESTO EN OBRA, INCLUYE: PERMATEX, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pza	4.00	\$339.37	\$1,357.48	-	4.00	4.00	100.00%	\$ 1,357.48
IHID5 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON MACHO GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO, CLASE 150, PUESTA EN OBRA, INCLUYE: PERMATEX, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pza	5.00	\$199.89	\$999.45	-		-	0.00%	\$

OPERADO RAMO 33
FISE 2024

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

IHID8 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE DE TOMA DOMICILIARIA. INCLUYE: TEE DE 2" Ó 1 1/2" Ó 1" , REDUCCION BUSHING DEX" A 1/2", LLAVE DE INSERCIÓN NPT A PE-AL-PE 1/2", MANGUERA KITEC AZUL 1/2", ADAPTADOR PE- AL-PE A NPT MACHO, TEE GAL. 1/2", 2 NIPLES GAL. 1/2" X 20 Y 60 CMS, 2 CODOS GAL. DE 1/2"X90", LLAVE DE NARIZ BCE. DE 1/2", HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	9.00	\$1,523.55	\$13,711.95	-	32.00	32.00	355.56%	\$ 48,753.60
IHID3 92	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE GALVANIZADO LONG. 30 CM DE 2" DE DIAMETRO, CED-40, A53, GRADO B, PUERTO EN OBRA, INCLUYE: PERMATEX, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	2.00	\$305.25	\$610.50	-	4.00	4.00	200.00%	\$ 1,221.00
IHID3 96-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE GALVANIZADO LONG. 3.00 CM DE 2" DE DIAMETRO, CED-40, A53, GRADO B, PUERTO EN OBRA, INCLUYE: PERMATEX, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	1.00	\$1,021.96	\$1,021.96	-	4.00	4.00	400.00%	\$ 4,087.84
IHID3 34	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GALVANIZADO DE 90° X 2" DE DIAMETRO, CLASE 150, PUERTO EN OBRA, INCLUYE: PERMATEX, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	2.00	\$491.07	\$982.14	-	5.00	5.00	250.00%	\$ 2,455.35
3	TUBERIA LINEA DE ABAJO				\$347,312.47					\$ 343,635.62
IHID3 18	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" CÉDULA 40, ASTM A53 NMX-B-177, PARED DE 0.154", A-53, GRADO B, 162 KG/CM2. ROSCADO. MCA. HYLSA O TUNA, INCLUYE: COPEL CUFUNSA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS LOCALES DE ESTIBA Y TOCO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m	730.00	\$378.29	\$276,151.70	730.00	-	730.00	100.00%	\$ 276,151.70

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

	CORRESPONDIENTES. MEDIDO COMPACTO. P.U.O.T.								
PRE1 13	RELLENO CON MATERIAL INERTE MEJORAMIENTO CALIDAD BASE (CHOY 30% Y GRAVA 70%) EN AREA PLATAFORMA DE TANQUE, COMPACTACION AL 100% DE SU P.V.S.M, CON MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE ESPESOR. INCL : MATERIALES, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. MEDIR COMPACTO. P.U.O.T.	m3	0.66	\$982.96	\$648.75	-	-	0.00%	\$
CIM00 1	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM² CON T.M.A. DE 3/4", HECHO EN OBRA, DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE; EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, ACARREOS, ELABORACIÓN, CARGA, VACIADO, EXTENDIDO; HABILITADO Y EL CURADO DE CIMBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m2	4.62	\$277.45	\$1,281.82	-	-	0.00%	\$
ALB13 9	LOSA DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", CIMBRA DE TERCERA, ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 @ 20 CMS EN AMBAS DIRECCIONES, UNA PARRILLA, ACABADO INTERIOR PULIDO, INCL: LOS MATERIALES, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL (15KG/M3), SILLETAS, BASTONES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO EN INDIRECTOS, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m2	4.62	\$1,175.23	\$5,429.56	-	-	0.00%	\$

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OPERADO RAMO 33
FISE 2024

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

ALB12 5-1	MUROS DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", CIMBRA APARENTE DE TERCERA, ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 @ 20 CMS EN AMBAS DIRECCIONES, UNA PARRILLA, ACABADO INTERIOR PULIDO, INCLUYE: LOS MATERIALES, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL (15 KG/M3), SILLETAS, BASTONES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO EN INDIRECTOS, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	m2	16.16	\$1,724.47	\$27,867.44	-	-	0.00%	1.69
ESTO 71	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, F'C= 200 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 @ 20 CMS EN AMBAS DIRECCIONES, ARMADO DE ACUERDO A LAS NTC-87, INCL: LOS MATERIALES, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, CHAFLANES, SILLETAS, BASTONES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO, COLADO, PRUEBAS DE LABORATORIO EN INDIRECTOS, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m2	7.98	\$1,403.51	\$11,200.01	-	-	0.00%	1.69
HYC1 01	TAPA DE 60X60 CMS, HECHA A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/4", CON DOS MANOS DE PRIMER ANTICORROSIVO, Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	4.00	\$2,544.76	\$10,179.04	-	-	0.00%	1.69

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

R45

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

IHID7 96	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE DESCARGA DE FOGA DE 4" X 1.10 MTS, CEDULA 40, ASTM PARED DE 0.237", A-53, GRADO B, 152 KG/CM2, ROSACDO INCLUYE: PLACA SOLDADA DE 25X25 CMS DE 3/8" DE ESPESOR, Y BRIDA ROSCABLE 4", MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	1.00	\$3,000.46	\$3,000.46	-	-	0.00%	\$
IHID7 97	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE LIMPIEZA DE FOGA DE 4" X 2.30 MTS, CEDULA 40, ASTM PARED DE 0.237", A-53, GRADO B, 152 KG/CM2, ROSACDO INCLUYE: PLACA SOLDADA DE 25X25 CMS DE 3/8" DE ESPESOR, COPLER GAL. 4", TAPON MACHO GAL. DE 4", HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	1.00	\$4,353.08	\$4,353.08	-	-	0.00%	\$
IHID7 98-A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE DEMASIAS DE A/C DE 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: CODO DE A/C DE 4" X 90° SOLDABLE, BRIDA SOLDABLE DE 4", REJILLA 8 MM, TORNILLERIA, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, 2 MANOS DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y 2 MANOS PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	1.00	\$3,197.39	\$3,197.39	-	-	0.00%	\$
6	PRELIMINARES LINEA DE ARRIBA				\$10,842.70				\$10,842.70
PREO 43	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRAULICA Y/O SANITARIA CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, LOCALIZACIÓN DE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACAS, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA MALEZA FUERA DE AREA DE TRABAJO, AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	m2	1,250.60	\$8.67	\$10,842.70	-	1,250.60	100.00%	\$10,842.70
7	VALVULAS Y CONEXIONES LINEA DE ARRIBA				\$34,439.82				\$21,390.35

OPERADO RAMO 33
FISE 2024

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

PRE1 07	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN ZANJAS EN TERRENO "B", A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD; LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIAS; LA CARGA Y EL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DENTRO Y HACIA FUERA DE OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AL DESTINO QUE ESTÉ AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. MEDIDO COMPACTO. P.U.O.T.	m3	0.71	\$131.42	\$93.31	-	-	0.00%	\$
PRE1 08	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA Y MARTILLO HIDRÁULICO EN ZANJA EN TERRENO TIPO "C", A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD; EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIAS; LA CARGA Y EL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DENTRO Y HACIA FUERA DE OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AL DESTINO QUE ESTÉ AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. MEDIDO COMPACTO. P.U.O.T.	m3	0.31	\$425.13	\$131.79	-	-	0.00%	\$
IHIDA 002	CAJA DE VALVULAS TIPO II DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, APLANADO INTERIOR, LOSA DE 14 CM, CONTRAMARCO DE CANAL 4", DE 1.10 M, MARCO Y TAPA DE Fo. Fo. TRAFICO PESADO, PARA UNA VALVULA EN TEE, SEGUN PLANO DE PROYECTO. INCL: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	1.00	\$9,845.02	\$9,845.02	-	-	0.00%	\$
IHID3 47-A	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BRIDADA DE 4" A 2" DE DIAMETRO, CLASE 150, PUESTA EN OBRA, INCLUYE: EMPAQUES FLEXITALIC Y TORNILLERIA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	1.00	\$3,357.15	\$3,357.15	-	1.00	100.00%	\$ 3,357.15

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

RUB

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

IHID4 34	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2" (51 MM.) DE DIÁMETRO NOMINAL; VÁSTAGO FIJO DE ACERO INOXIDABLE; EXTREMOS BRIDADOS (ANSI 150); CUERPO Y TAPA DE HIERRO DÚCTIL; DISCO DE HIERRO DÚCTIL ENCAPSULADO CON HULE (EPDM) ; TORNILLERÍA EN ACERO EMBUTIDO EN PLÁSTICO; RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR CON EPÓXICO COLOR AZUL; PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 250 PSI; NORMA AWWA C515, PUESTA EN OBRA (CUMPLIR ESPECIFICACIÓN SUAPVA3000-CEA), INCLUYE: EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLERÍA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMOLETA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	1.00	\$5,351.07	\$5,351.07	-	1.00	1.00	100.00%	\$ 5,351.07
IHID4 51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 1/2" DE DIÁMETRO, CLASE 125, CUERPO Y TAPA DE HIERRO GRIS ASTM 126 GRADO B, RECUBIERTO EPOXICO AZUL POR FUSIÓN, NORMA AWWA C550, ROSCA NPT PN16, FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE ASTM A240, ASIENTO BUNA - N (ACRILONITRILO) ASTM D2000, CUBIERTA COLD ROLLED, TORNILLOS MIL Y ALLEN ACERO SAE GRADO 2 Y ACERO ALEADO RC38 GRADO 9 TROPICALIZADOS, TAPON DE CONBINACION Y LLENADO DE BRONCE, ROSCABLE PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO 200 PSI, REFERENCIA: A1 SIMEX, INCLUYE: REDUCCION BUSHING GAL. X" A 1/2", 2 NIPLES GAL. 1/2" C-40, VÁLVULA DE ESFERA WOG 400PSI, PERMATEX, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P. U. O. T.	pza	1.00	\$3,789.65	\$3,789.65	-	-	-	0.00%	\$
IHID4 18	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA A/C ROSC. 2" CLASE 150, PUESTO EN OBRA, INCLUYE: PERMATEX, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	1.00	\$339.37	\$339.37	-	2.00	2.00	200.00%	\$ 678.74

OPERADO RAMO 33
FISE 2024

"Este programa es público, ajeno a cualquier
partido político. Queda prohibido el uso para
finos distintos a los establecidos en el programa"

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
proviene de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

IHID3 95	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE GALVANIZADO LONG. 60 CM DE 2" DE DIAMETRO, CED-40, A53, GRADO B, PUESTO EN OBRA, INCLUYE: PERMATEX, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	1.00	\$500.71	\$500.71	-	-	-	0.00%	\$ -
IHID3 50	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING DE 2" A 1 1/2" DE DIAMETRO, CLASE 150, PUESTA EN OBRA, INCLUYE: PERMATEX, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	1.00	\$181.45	\$181.45	-	5.00	5.00	500.00%	\$ 907.25
IHID3 88	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE GALVANIZADO LONG. 60 CM DE 1 1/2" DE DIAMETRO, CED-40, A53, GRADO B, PUESTO EN OBRA, INCLUYE: PERMATEX, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	1.00	\$337.82	\$337.82	-	16.00	16.00	1600.00%	\$ 5,405.12
IHID5 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON MACHO GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO, CLASE 150, PUESTA EN OBRA, INCLUYE: PERMATEX, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	2.00	\$135.84	\$271.68	-	4.00	4.00	200.00%	\$ 543.36
IHID3 33	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GALVANIZADO DE 90° X 1 1/2" DE DIAMETRO, CLASE 150, PUESTO EN OBRA, INCLUYE: PERMATEX, MATERIALES, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	5.00	\$161.90	\$809.50	-	10.00	10.00	200.00%	\$ 1,619.00
IHID3 40	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GALVANIZADO DE 45° X 1 1/2" DE DIAMETRO, CLASE 150, PUESTO EN OBRA, INCLUYE: PERMATEX, MATERIALES, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	6.00	\$161.90	\$971.40	-	-	-	0.00%	\$ -

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OPERADO RAMO 33
FISE 2024

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"


ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

IHID3 19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE GALVANIZADA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, CLASE 150, PUESTA EN OBRA, INCLUYE: PERMATEX, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	3.00	\$187.96	\$563.88	-	6.00	6.00	200.00%	\$ 1,127.76
IHID3 26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, CLASE 150, PUESTA EN OBRA, INCLUYE: PERMATEX, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	10.00	\$240.09	\$2,400.90	-	10.00	10.00	100.00%	\$ 2,400.90
IHID4 60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ELIMINADORA DE AIRE DE 1/2" DE DIÁMETRO, CLASE 125, CUERPO Y TAPA DE HIERRO GRIS ASTM 126 GRADO B, RECUBIERTO EPOXICO AZUL POR FUSIÓN, NORMA C512-15, ROSCA NPT, FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE ASTM A240, ASIENTO BUNA - N (ACRILONITRILO) ASTM D2000, ESPREA Y MECANISMO DELRIN ASTM D2133, TORNILLOS ACERO SAE GRADO 2 TROPICALIZADOS, ROSCABLE PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO 200 PSI, REFERENCIA: E10 VAMEX, INCLUYE: REDUCCION BUSHING GAL. X" A 1/2", 2 NIPLES GAL. 1/2" C-40, VÁLVULA DE ESFERA WOG 400PSI, PERMATEX, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P. U. O. T.	pza	2.00	\$2,747.56	\$5,495.12	-	-	-	0.00%	\$ -
8	TUBERIA LINEA DE ARRIBA				\$476,993.79					\$467,961.30
IHID3 17	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" CÉDULA 40, ASTM A53, NMX-B-177, PARED DE 0.145", A-53, GRADO B, 84 KG/CM2. ROSCADO. MCA. HYLSA O TUNA, INCLUYE: COPLE CIFUNSA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS LOCALES DE ESTIBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m	1,250.60	\$309.13	\$386,597.98	1,250.60	-	1,250.60	100.00%	\$ 386,597.98

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OPERADO RAMO 33
FISE 2024

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

IHID3 03	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" CÉDULA 40. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m	1,250.60	\$64.17	\$80,251.00	-	1,250.60	1,250.60	100.00%	\$ 80,251.00
IHID0 02	ATRAQUE DE 25X25 CMS DE ALTURA VARIABLE, CONCRETO F'C= 200kg/cm2. ARMADO CON 4 VAR. DEL No. 3 Y EST. DEL No. 2 @ 20 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m3	1.97	\$5,149.65	\$10,144.81	-	0.22	0.22	10.96%	\$ 1,112.32
9	OBRA CIVIL LINEA DE ARRIBA				\$20,332.98					\$0.00
HYC1 05	REJILLA DE PROTECCION DE VALVULA A2/E10, DE 60*60*75 CM, INCL. TAPA DE REJILLA, Y BASE DE 70*70*10 CM DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	3.00	\$6,777.66	\$20,332.98	-		-	0.00%	\$ -
10	ATIPICOS				\$0.00					\$ 71,506.00
AT 001	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO CAPAZ DE VENCER UNA CDT=25 M, A UN GASTO DE 1.0 LPS, CONEXIÓN DE 0.5 HP, SISTEMA ELECTRICO MONOFASICO 115V, MCA. AQUAPAK MOD. M1X05-5, MOTOR MSQA4 1/21115 O IGUAL Y/O SUPERIOR CALIDAD, INCL. 15 MTS DE CABLE SUMERGIBLE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P. U. O. T.	PZA	1.00	22,988.82		1.00		1.00	100.00%	\$ 22,988.82
AT002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, BICAPA DE 10,000 LTS, C/BRIDA DE DESCARGA DE 2", GARANTIA POR ESTRITO: 10 AÑOS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	1.00	48,517.18		1.00		1.00	100.00%	\$ 48,517.18
					EST.1	EST.2				
SUB TOTAL					\$ 1,034,399.74	\$ 662,749.68	\$ 347,062.78	SUB TOTAL		\$ 1,009,812.45

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

IVA	\$ 165,503.96	\$ 106,039.95	\$ 55,530.05	IVA	\$ 161,569.99
TOTAL	\$ 1,199,903.70	\$ 768,789.63	\$ 402,592.83	TOTAL	\$ 1,171,382.44

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

OPERADO RAMO 33
FISE 2024

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

ENTREGA EMPRESA




C ENRIQUE RESENDIZ OCAMPO
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO



ING. CIPRIANO MARCELO BALDERAS MENDOZA
COORDINADOR DE SUPERVISION DE OBRA




ING EDUARDO RESENDIZ RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRA



ING. RICARDO VIEYRA BONILLA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.

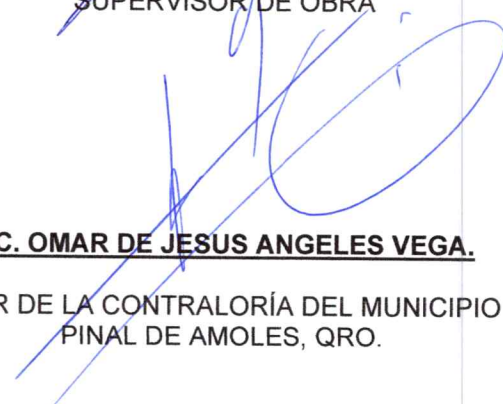

LIC. OMAR DE JESUS ANGELES VEGA.

TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.

"Este programa es público, ajeno a cualquier
partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos a los establecidos en el programa"

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
proviene de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

**OPERADO RAMO 33
FISE 2024**
