

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 09:00 horas del día 30 de NOVIEMBRE de 2020 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE SAN JUAN BARRIO LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE SAN JUAN" por parte del Municipio de Pinal de Amoles el jefe de supervisores Ing. German Flores Reyes y supervisor de obra Ing. Eduardo Reséndiz Ramírez, y por parte de la contratante MANUEL MARTÍNEZ GUZMÁN en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, El Acta De Entrega- Recepción Física de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE SAN JUAN BARRIO LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE SAN JUAN
Localidad	PINAL DE AMOLES
No. De contrato	MPA-DOP-FISDMF-AD-050-2020
Programa	FISDMF 2020
No. De Obra	PY-125
Monto contratado	\$ 299,935.02
Ampliación el monto	
Oficio De Aprobación. No.	MPA-CPDM-FISDMF-SC-042-2020
Fecha Oficio De Aprobación	MARZO DE 2020
Beneficiarios	

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 11 de OCTUBRE de 2020 y termina de obra el 30 de NOVIEMBRE de 2020.

Estados financieros:


Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$ 299,935.02 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 02/100 86/100 M.N.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1(unos)	10/11/2020	Del	14/10/2020	Al	10/11/2020	\$ 278,356.04	\$278,356.04
2(dos)	30/11/2020	Del	11/10/2020	Al	30/11/2020	\$21,578.98	\$299,935.02

G.F.R.

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 2 (DOS) FINIQUITO.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	VOLUMEN			AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
					ESTIMACION No 1	ESTIMACION No 2	VOLUMEN ACOMULADO		
REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRERA DE SAN JUAN BARRIO LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE CERRERA DE SAN JUAN									
PRELIMINARES									
1	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO PARA LINEA DE AGUA INC ESTACAS MOJONERAS BANCOS DE NIVEL EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	897 62	\$ 11 73	903 10	-	903 10	100.61%	\$ 10 593 36
2	SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" CÉDULA 40 A-53 GRADO B ROSCADO MCA. TUNA O HILSA INCLUYE COPLES MCA. CIFUNSA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA. ASÍ COMO LAS MANIOBRAS LOCALES DE ESTIBA Y MANIOBRAS LOCALES	ML	903 10	\$ 224 81	903 10	-	903 10	100.00%	\$ 203 025 91
3	INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2" DE FIERRO GALVANIZADO CED 40. INCLUYE JUNTEO PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	903 10	\$ 21 20	903 10	-	903 10	100.00%	\$ 19 145 72
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING DE FOGA DE 2" A 1 1/2" INCLUYE EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA. MATERIALES HERRAMIENTAS EQUIPO MANO DE OBRA ACARREOS Y MANIOBRAS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T	PZA	1 00	\$ 96 13	-	-	-	0.00%	\$ -
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE 1 1/2" X 20 CMS DE FOGA. INCLUYE EL FLETE AL LUGAR DE OBRA	PZA	1 00	\$ 126 65	-	4 00	4 00	400.00%	\$ 506 60
6	SUMINISTRO DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE COMBINADA DE 1/2" DE DIÁMETRO ACERO AL CARBON CLASE 150 ROSCADA PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO 250 PSI. INCLUYE REDUCCION BUSHING DE 1 1/2"-1/2" NIPLES VALVULA DE ESFERA Y MANIOBRAS LOCALES	PZA	2 00	\$ 2 076 13	2 00	-	2 00	100.00%	\$ 4 152 26
7	INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE COMBINADA DE 1/2" INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE CONTACTO Y PERMATEX	PZA	2 00	\$ 200 08	2 00	-	2 00	100.00%	\$ 400 16
8	SUMINISTRO DE CODO DE FOGA DE 1 1/2" X 45". INCLUYE EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA	PZA	3 00	\$ 38 20	6 00	-	6 00	200.00%	\$ 229 20
9	INSTALACION DE CODO DE FOGA DE 1 1/2" X 45" INCLUYE PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	3 00	\$ 27 92	6 00	-	6 00	200.00%	\$ 167 52
10	SUMINISTRO DE TEE DE FOGA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA	PZA	1 00	\$ 130 85	4 00	-	4 00	400.00%	\$ 523 40


[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

G.F.P.



**SEGURIDAD Y
CONFIANZA**
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021


**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

11	INSTALACION DE TEE DE FOGA DE 1 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	1.00	\$ 37.35	4.00	-	4.00	400.00%	\$ 149.40
12	SUMINISTRO DE TAPON MACHO DE FOGA DE 1 1/2" INCLUYE EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA	PZA	1.00	\$ 97.98	1.00	-	1.00	100.00%	\$ 97.98
13	INSTALACION DE TAPON MACHO DE FOGA DE 1 1/2" INCLUYE PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	1.00	\$ 27.92	1.00	-	1.00	100.00%	\$ 27.92
14	SUMINISTRO DE TUERCA UNION DE 1 1/2" INCLUYE EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA	PZA	9.00	\$ 134.01	9.00	-	9.00	100.00%	\$ 1 206.09
15	INSTALACION DE TUERCA UNION DE 1 1/2" INCLUYE PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	9.00	\$ 27.02	9.00	-	9.00	100.00%	\$ 243.18
OBRA CIVIL									
16	CORTE Y/O EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" INC TRASPALO HORIZONTAL A LA PRIMERA ESTACION DE 20 MTS AFINE DE TALUD LA HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION (MEDIR COMPACTO)	M3	1.38	\$ 257.31	-	1.35	1.35	97.83%	\$ 347.37
17	ATRAQUE DE 30X30 CMS DE ALTURA VARIABLE CONCRETO F'c= 200kg/cm2 ARMADO CON 6 VAR DEL No 3 Y EST DEL No 2 @ 20 CMS INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y MANO DE OBRA	M3	1.75	\$ 8 073.70	-	1.62	1.62	92.62%	\$ 13 085.64
18	REJILLA DE PROTECCION DE TREN DE VALVULAS TIPO 1 DE 50*50*70 CM EN D VER PLANO INCL TAPA DE REJILLA Y BASE DE 60*60*10 CM DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 KG/CM2 EN D Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	2.00	\$ 2 331.48	-	2.00	2.00	100.00%	\$ 4 662.96
									subtotal \$ 258,584.67
									iva \$ 41,370.36
									total \$ 299,955.02

G. F. R.



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Fianza De Garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga fianza, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **PAGARE NO. 03** . fianza que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/409-D/2020**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **30 de NOVIEMBRE de 2020**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumplandose la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecuntados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 10:00 horas del dia 30 de NOVIEMBRE de 2020, en cabecera municipal, Pinal de Amoles, Queretaro.



**SEGURIDAD Y
CONFIANZA**
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2017

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

ANEXO 1


RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, MANUALES E INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CERTIFICADO DE GARANTIA Y CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, RECIBIDOS POR LA SUPERVISION DE OBRA.

Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)
3	1	Reporte Fotográfico en CD

ENTREGA EMPRESA


MANUEL MARTÍNEZ GUZMÁN
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO

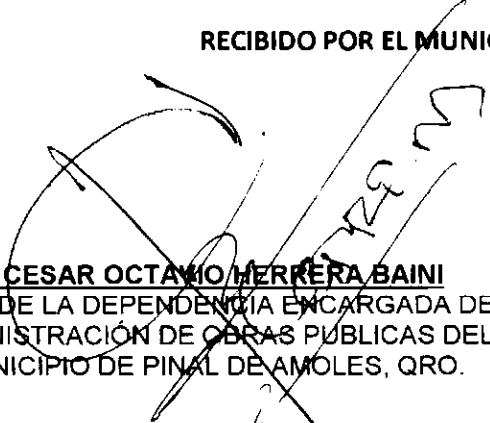
C. CESAR OCTAVIO HERRERA BANI
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.


C. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.


ING. GERMAN FLORES REYES
JEFE DE SUPERVISORES


ING. EDUARDO RESENDIZ RAMÍREZ
SUPERVISOR DE OBRA
